



42

Gorzów Wlkp., 18 lutego 2019 r.

Paulina Szymotowicz
Radna Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

19. 02. 2019
WOP V

wpł. KRM
19-02-2019
Zbiciński

Sz. P.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Interpelacja
w sprawie harmonogram prac remontowych.

Zwracam się do Pana z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac dotyczących remontów w centrum miasta oraz remontu ul. Kostrzyńskiej.

Przedłużające się prace są powodem frustracji gorzowian, głównie mieszkańców os. Słonecznego i Wieprzyc. Oba remontowane obszary są ze sobą powiązane komunikacyjnie, dlatego proszę o aktualny harmonogram przeprowadzanych prac w celu przedstawienia ich zainteresowanym mieszkańcom.

Proszę także o określenie stopnia opóźnienia od początkowo założonego harmonogramu.

Szymotowicz Paulina

WOP, d

19. 02. 2019





**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 27.02.2019 r.

WIN.IV.0003.6.2019.ŁW

**Paulina Szymotowicz
Radna Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.**

04-03-2019
NOR ✓ Julia

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.02.2019 r. w sprawie harmonogramu prac informuje, iż zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą Robót firmą Trakcja PRKiI, termin końcowy na ukończenie zadania pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” - przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Warszawskiej i Sikorskiego określony jest do dnia 23.08.2019 r. Aktualne harmonogramy przedkładane przez Wykonawcę Robót dot. przebudowy ul. Warszawskiej i Sikorskiego umieszczane są na stronie internetowej www.transport.gorzow.pl.

Przedkładam również harmonogram w formie wykresu Gantta dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” oraz harmonogram uproszczony obrazujący planowane terminy realizacji poszczególnych odcinków robót. Nadmieniam, że w przypadku ul. Kostrzyńskiej terminy umowne zakończenia robót to: dla prac torowych – 20.04.2019 r., dla prac drogowych – 20.09.2019 r. Obecnie Wykonawca poinformował o przejezdności torowiska tramwajowego. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe i regulacyjne sieci trakcyjnej. W zakresie robót drogowych opóźnienie występuje w rozpoczęciu robót na odcinku obejmującym przebudowę wiaduktu kolejowego i spowodowane jest toczyjącymi się pracami na estakadzie kolejowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Surmacz
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki:

- harmonogram Gantta,
- harmonogram schematyczny.

Rozdzielnik:

1. KPM
2. WOR
3. WIN a/a

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	2018, Kw 2				2018, Kw 3				2018, Kw 4				2019, Kw 1				2019, Kw 2				2019, Kw 3				2019, Kw 4			
							mar	kw	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kw	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	mar	kw	mai	cze	lip	sie	wrz	paź
1	ODCINEK 1, TARTACZNA - MZK 1+465 - 1+742																																	
2	TER 1 ROBOTY DROGOWE																																	
3	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	10 dn	pią, 18-05-18	czw, 18-05-31		8;12																												
4	Roboty ziemne	20 dn	pią, 18-06-29	czw, 18-07-26	8;12	5																												
5	Podbudowy, elementy ulic	19 dn	pią, 18-07-27	śro, 18-08-22	4	6																												
6	Nawierzchnie bitumiczne	3 dn	czw, 18-08-23	pon, 18-08-27	5	10;33																												
7	TER 3 KANALIZACJA DESZCZOWA																																	
8	Kanały i przykanaliki, studnie i wpusty	20 dn	pią, 18-06-01	czw, 18-06-28	3	4																												
9	TER 5 OŚWIETLENIE DROGOWE																																	
10	Latarnie oświetleniowe, linie kablowe oświetleniowe	35 dn	wto, 18-08-28	pon, 18-10-15	6																													
11	TER 14 ZIELEŃ																																	
12	Roboty przygotowawcze - karczowanie	3 dn	pią, 18-06-01	wto, 18-06-05	3	4																												
13	Zieleń projektowana	24 dn	pon, 19-07-15	czw, 19-08-15		212																												
14	ODCINEK 2, Plac Słoneczny 2+400 - 3+010																																	
15	TER 1 ROBOTY DROGOWE																																	
16	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	10 dn	pon, 18-07-16	pią, 18-07-27		21;25ZR+10 dn;27ZR+3																												
17	Roboty ziemne	16 dn	pon, 18-08-27	pon, 18-09-17	21;25;27;29	18																												
18	Podbudowy, elementy ulic	6 dn	wto, 18-09-18	wto, 18-09-25	17	19																												
19	Nawierzchnie bitumiczne	3 dn	śro, 18-09-26	pią, 18-09-28	18	23;55																												
20	TER 3 KANALIZACJA DESZCZOWA																																	
21	Kanały i przykanaliki, studnie i wpusty	20 dn	pon, 18-07-30	pią, 18-08-24	16	17																												
22	TER 5 OŚWIETLENIE DROGOWE																																	
23	Latarnie oświetleniowe, linie kablowe oświetleniowe	45 dn	pon, 18-10-01	pią, 18-11-30	19																													
24	TER 6 SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA																																	
25	Kolizja nr 21 - linia kablowa SN	5 dn	pon, 18-08-13	pią, 18-08-17		16ZR+10 dn 17																												
26	TER 10 TELEKOMUNIKACJA																																	
27	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.	14 dn	czw, 18-08-02	wto, 18-08-21		16ZR+3 dn 17																												
28	TER 14 ZIELEŃ																																	
29	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	3 dn	czw, 18-08-02	pon, 18-08-06		16ZR+3 dn 17																												

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	2018, Kw 2												2018, Kw 3				2018, Kw 4				2019, Kw 1				2019, Kw 2				2019, Kw 3				2019, Kw 4																
							mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź													
59	Prace rozbiórkowe	5 dn	śro, 18-10-03	wto, 18-10-09		55RR+2 dn																																																	
60	TER 3 KANALIZACJA DESZCZOWA																																																						
61	Kanały i przykanaliki, studnie i wpusty	15 dn	pon, 19-03-18	pią, 19-04-05		67RR+25 dn 68																																																	
62	TER 5 OŚWIETLENIE DROGOWE																																																						
63	Latarnie oświetleniowe, linie kablowe oświetleniowe	15 dn	pon, 19-06-03	pią, 19-06-21		57																																																	
64	MURY OPOROWE - Kostrzyńska południowa 0+310 - 0+620																																																						
65	Wykopy i rozbiórki	15 dn	pon, 18-10-15	pią, 18-11-02		55	66																																																
66	Fundamentowanie i zasypki	20 dn	pon, 18-11-05	pią, 18-11-30		65	67																																																
67	Ściany z bloczków i nasyp zbrojony geosiatką	45 dn	pon, 18-12-03	pon, 19-04-15		66	68;61RR+25 dn																																																
68	Kapy chodnikowe i zwięzczenie gzymsów	10 dn	wto, 19-04-16	pon, 19-04-29		67;61	56																																																
69	ODCINEK 4A, ULICA ŻEGLARSKA																																																						
70	TER 1 ROBOTY DROGOWE																																																						
71	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	10 dn	pon, 18-08-20	pią, 18-08-31			79																																																
72	Podbudowy, elementy ulic	12 dn	czw, 19-04-18	pią, 19-05-03		82	73																																																
73	Nawierzchnie bitumiczne	3 dn	pon, 19-05-06	śro, 19-05-08		72	77																																																
74	TER 3 KANALIZACJA DESZCZOWA																																																						
75	Kanały i przykanaliki, studnie i wpusty	28 dn	śro, 18-11-28	pon, 19-03-18		81RR+30 dn 82																																																	
76	TER 5 OŚWIETLENIE DROGOWE																																																						
77	Latarnie oświetleniowe, linie kablowe oświetleniowe	15 dn	czw, 19-05-09	śro, 19-05-29		73																																																	
78	MURY OPOROWE - Żeglarska																																																						
79	Wykopy i rozbiórki	15 dn	pon, 18-09-03	pią, 18-09-21		71	80;170RR+5 dn																																																
80	Fundamentowanie i zasypki	10 dn	pon, 18-09-24	pią, 18-10-05		79	81																																																
81	Ściany z bloczków i nasyp zbrojony geosiatką	68 dn	pon, 18-10-08	czw, 19-03-21		80	75RR+30 dn;82																																																
82	Kapy chodnikowe i zwięzczenie gzymsów	19 dn	pią, 19-03-22	śro, 19-04-17		81;75	72																																																
83	ODCINEK 5, TARTACZNA - PROMIENNA 1+742 - 2+250																																																						
84	TER 1 ROBOTY DROGOWE																																																						
85	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	14 dn	wto, 18-11-06	pią, 18-11-23		36	90;97ZR+3 dn;95ZR+3																																																
86	Roboty ziemne	10 dn	wto, 19-03-12	pon, 19-03-25		90;95;97	87																																																
87	Podbudowy, elementy ulic	17 dn	wto, 19-03-26	śro, 19-04-17		86	88																																																

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki																								
							2018, Kw 2		2018, Kw 3		2018, Kw 4		2019, Kw 1		2019, Kw 2		2019, Kw 3		2019, Kw 4											
							mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź				
145	MURY OPOROWE, ul. Zatorze																													
146	Wykopy i rozbiórki	10 dn	wto, 19-05-28	pon, 19-06-10	132	147																								
147	Fundamentowanie i zasypki	10 dn	wto, 19-06-11	pon, 19-06-24	146	148																								
148	Ściany z bloczków i nasyp zbrojony geosiatką	12 dn	wto, 19-06-25	śro, 19-07-10	147	149;136RR+ dn																								
149	Kapy chodnikowe i zwięzienie gzymsów	12 dn	czw, 19-07-11	pią, 19-07-26	148;136	133;138ZR+ dn																								
150	ODCINEK 5', DOBRA - S3																													
151	TER 1 ROBOTY DROGOWE																													
152	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	129 dn	wto, 18-11-06	pon, 19-07-15	36	156RR+9 dn;160RR+5																								
153	Roboty ziemne	124 dn	śro, 18-11-21	wto, 19-07-23	156RR+2 dn	154RR+8 dn																								
154	Podbudowy i nawierzchnie, elementy ulic	135 dn	pon, 18-12-03	pon, 19-08-19	153RR+8 dn	158RR+5 dn;212																								
155	TER 3 KANALIZACJA DESZCZOWA																													
156	Kanały i przykanaliki, studnie i wpusty	125 dn	pon, 18-11-19	pon, 19-07-22	152RR+9 dn	153RR+2 dn																								
157	TER 5 OŚWIETLENIE DROGOWE																													
158	Latarnie oświetleniowe, linie kablowe oświetleniowe	130 dn	pon, 18-12-10	pon, 19-08-19	154RR+5 dn	212																								
159	TER 10 TELEKOMUNIKACJA																													
160	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Polkomtel S.A. - przepusty	15 dn	pon, 18-11-12	pią, 19-04-05	152RR+5 dn																									
161	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - przepusty	14 dn	wto, 18-11-13	pią, 19-04-05	152RR+5 dn																									
162	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A. - przepusty	14 dn	wto, 18-11-13	pią, 19-04-05	152RR+5 dn																									
163	TER 14 ZIELEN																													
164	Roboty przygotowawcze - karczowanie	92 dn	wto, 18-11-13	pią, 19-05-31	152RR+5 dn																									
165	Zieleń projektowana	24 dn	pon, 19-07-15	czw, 19-08-15		212																								
166	TER 2 OBIEKTY INŻYNIERYJNE																													
167	CZĘŚĆ MOSTOWA																													
168	Podpora 1	40 dn	pon, 18-10-08	pią, 18-11-30	55RR+5 dn;170RR+5	169																								
169	Podpora 2	15 dn	pon, 18-12-03	wto, 19-01-15	168	171																								
170	Podpora 3	40 dn?	pon, 18-09-10	pią, 18-11-02	79RR+5 dn	168RR+5 dn																								
171	Płyta ustroju z belek "Kujan"	12 dn	śro, 19-01-16	pią, 19-03-15	169	172																								
172	Nawierzchnia, izolacje i roboty wykończeniowe	19 dn	pon, 19-03-18	czw, 19-04-11	171	173																								
173	Pozwolenie na użytkowanie	22 dn	pią, 19-04-12	pon, 19-05-13	172	132;113;174																								

Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

od 18-11-12 do 18-11-23

od 19-04-01 do 19-04-05

od 18-11-13 do 18-11-23

od 19-04-01 do 19-04-05

od 18-11-13 do 18-11-23

od 19-04-01 do 19-04-05


Przerwa zimowa od 18-12-21 do 19-03-03

Id.	Tr, za	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	2018, Kw 2												2018, Kw 3				2018, Kw 4			2019, Kw 1		2019, Kw 2			2019, Kw 3		2019, Kw 4					
								mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź												
174		Wyburzenie obiektów budowlanych - wiadukt	24 dn	wto, 19-05-14	pią, 19-06-14	173																																	
175		TER 12 TOROWISKO	211 dn	pon, 18-05-21	pon, 19-05-20																																		
176		ROBOTY TOROWE	186 dn	pon, 18-05-21	pon, 19-04-15																																		
177		Rozbiórki podbudowy tłuczniowej, nawierzchni torowej i elementów ulic	40 dn	pon, 18-05-21	pią, 18-07-13		178ZR+3 dn;179ZR+1																																
178		Przejście kanalizacją deszczową drogową pod torowiskiem do wylotu 21	6 dn	czw, 18-07-19	czw, 18-07-26		177ZR+3 dn																																
179		Przejście kanalizacją deszczową drogową pod torowiskiem do wylotu 20	6 dn	czw, 18-08-30	czw, 18-09-06		177ZR+10 dn																																
180		Korytowanie, drenaż i podtorze	80 dn	pon, 18-06-18	pią, 18-10-05		177RR+20 dn	182RR+20 dn																															
181		Nawierzchnie i elementy ulic	66 dn	pon, 18-09-24	pon, 19-04-15		182RR+50 dn	200																															
182		Roboty torowe	89 dn	pon, 18-07-16	pią, 19-03-29		180RR+20 dn	181RR+50 dn;191RR+5																															
183		TER 16 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA																																					
184		Słupy trakcyjne	66 dn	pon, 18-07-16	pon, 18-10-15		177	185;187																															
185		Sieć trakcyjna	44 dn	wto, 18-10-16	pią, 19-04-12		184	200																															
186		TER 17 ZASILANIE TRAKCJI																																					
187		Punkt zasilający PZ1, PZ2 i punkt powrotny PP1, PP2	19 dn	wto, 18-10-16	pią, 18-11-09		184;189																																
188		TER 18 ZASILANIE TRAKCJI - TRAKCYJNE LINIE KABLOWE																																					
189		Trakcyjne linie kablowe do PZ1, PZ2 i PP1, PP2	65 dn	pon, 18-07-16	pią, 18-10-12		177	187																															
190		TER 19 STEROWANIE ZWROTNIC																																					
191		Rozjazd tramwajowy nr 1, Zwrotnice tramwajowe elektryczne	20 dn	pon, 18-09-24	pią, 18-10-19		182RR+50 dn																																
192		Rozjazd tramwajowy nr 2, Zwrotnice tramwajowe elektryczne	20 dn	pon, 18-09-24	pią, 18-10-19		182RR+50 dn																																
193		Rozjazd tramwajowy nr 3, Zwrotnice tramwajowe elektryczne	20 dn	pon, 18-10-08	pią, 18-11-02		182RR+60 dn																																
194		Rozjazd tramwajowy nr 4, Zwrotnice tramwajowe elektryczne	20 dn	pon, 18-10-08	pią, 18-11-02		182RR+60 dn																																
195		TERMIN WYKONANIA TOROWISKA W ZAKRESIE OKREŚLONYM W OPZ pkt. 2.1 7 m-cy																																					
196		Termin wykonania torowiska w zakresie określonym w OPZ pkt. 2.1 7 m-cy	1 dzień	wto, 18-11-20	wto, 18-11-20																																		
197		TERMIN WYKONANIA ROBÓT TOROWYCH I TRAKCYJNYCH 12 m-cy																																					
198		Termin wykonania robót torowych i trakcyjnych 12 m-cy	1 dzień	sob, 19-04-20	sob, 19-04-20																																		
199		POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE																																					
200		Pozwolenie na użytkowanie	21 dn	pon, 19-04-22	pon, 19-05-20		181;185																																
201		TER 12 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA																																					
202		Organizacja ruchu tymczasowa	301 dn	pią, 18-05-18	pią, 19-09-20																																		


07.11.18_Harmonogram_Kostrzyńska_kamień milowy

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	2018, Kw 2												2019, Kw 1				2019, Kw 2				2019, Kw 3				2019, Kw 4					
							mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź		
203	TER 8 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA DROGOWA																																			
204	Sygnalizacja świetlna drogowa	48 dn	wto, 18-10-16	czw, 18-12-20	34RR+5 dn																															
205	TER 8 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA TOROWA																																			
206	Sygnalizacja świetlna torowa	80 dn	pią, 18-08-31	czw, 18-12-20	177ZR+34 dn																															
207	TER 13 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO																																			
208	Organizacja ruchu docelowego	88 dn	czw, 19-05-02	sob, 19-08-31	212ZR-10 dn																															
209	CHODNIKI, PARKINGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE																																			
210	Chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, zjazdy	232 dn	wto, 18-07-03	śro, 19-07-31																																
211	POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE																																			
212	Pozwolenie na użytkowanie	24 dn	wto, 19-08-20	pią, 19-09-20	208ZR-10 dn;165;158;																															
213	TERMIN WYKONANIA CAŁOŚCI ZAKRESU UMOWY 17 m-cy																																			
214	Termin wykonania całości zakresu umowy 17 m-cy	1 dzień	pią, 19-09-20	pią, 19-09-20																															09-20	

Rozbudowa DW nr 132 od km 39+594 do km 42+605 w ramach zamierzenia budowlanego przebudowy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

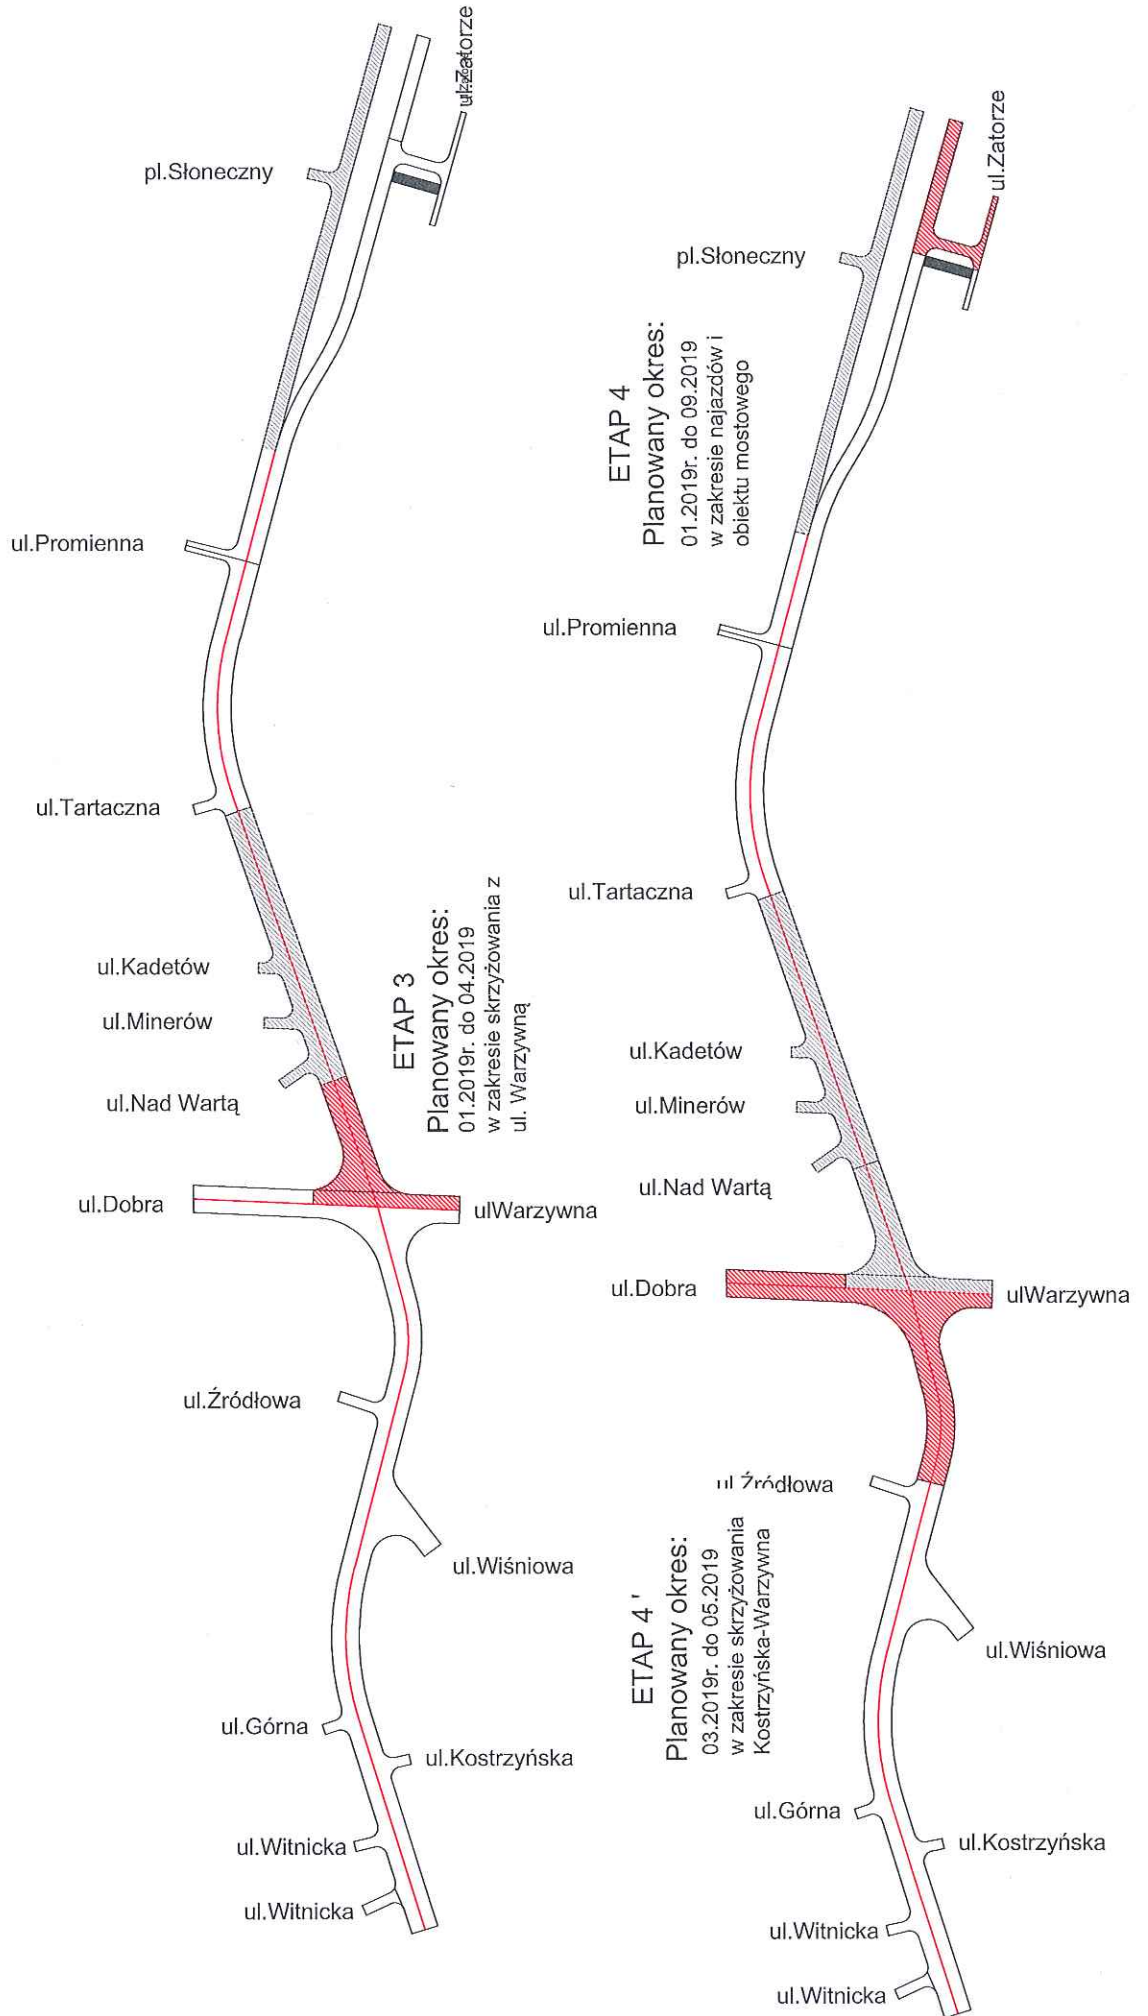

Rozbudowa DW nr 132 od km 39+594 do km 42+605 w ramach zamierzenia budowlanego przebudowy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

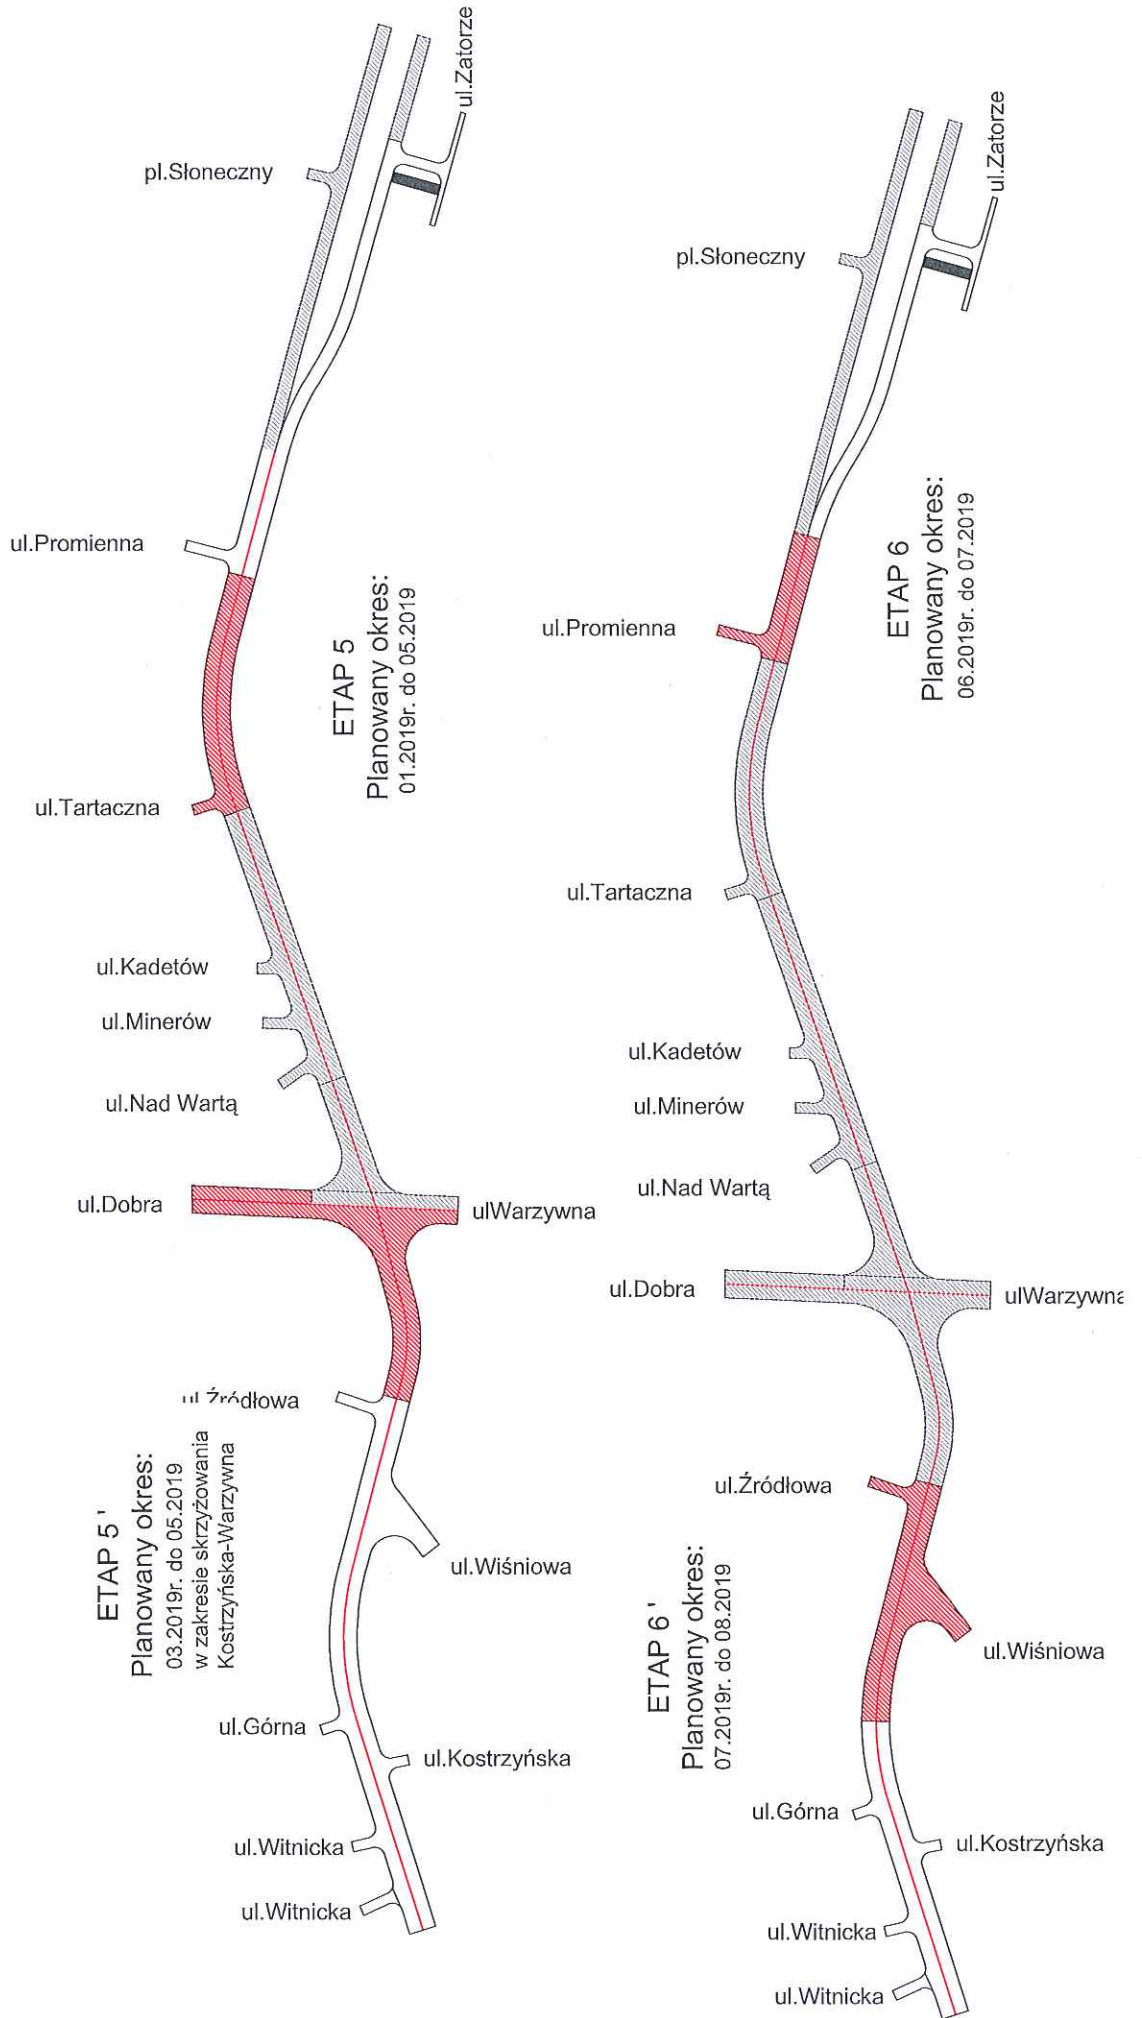

Rozbudowa DW nr 132 od km 39+594 do km 42+605 w ramach zamierzenia budowlanego przebudowy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

